



工事概要

工事名称	東北大学（片平）金研スーパーコンピューター棟101号室内装改修工事
工事位置	仙台市青葉区片平二丁目１－１ 東北大学片平団地構内
完成期限	2025年12月12日 金曜日
建物概要	金研スーパーコンピューター棟：RC造 2階建 建築面積 364㎡ 延べ床面積 743㎡
工事内容	スーパーコンピューター棟101号室（改修床面積：215.75㎡） ・フリーアクセスフロア：パネル交換及び予備パネル納入 ・壁、鋼製建具（101号室に面する片側のみ）：塗装改修 【壁・建具の塗装はスーパーコンピューターの点検休止期間（10月（予定）の指定する土日2日間）に合わせて施工すること】 ※関連する電気設備工事、機械設備工事：なし

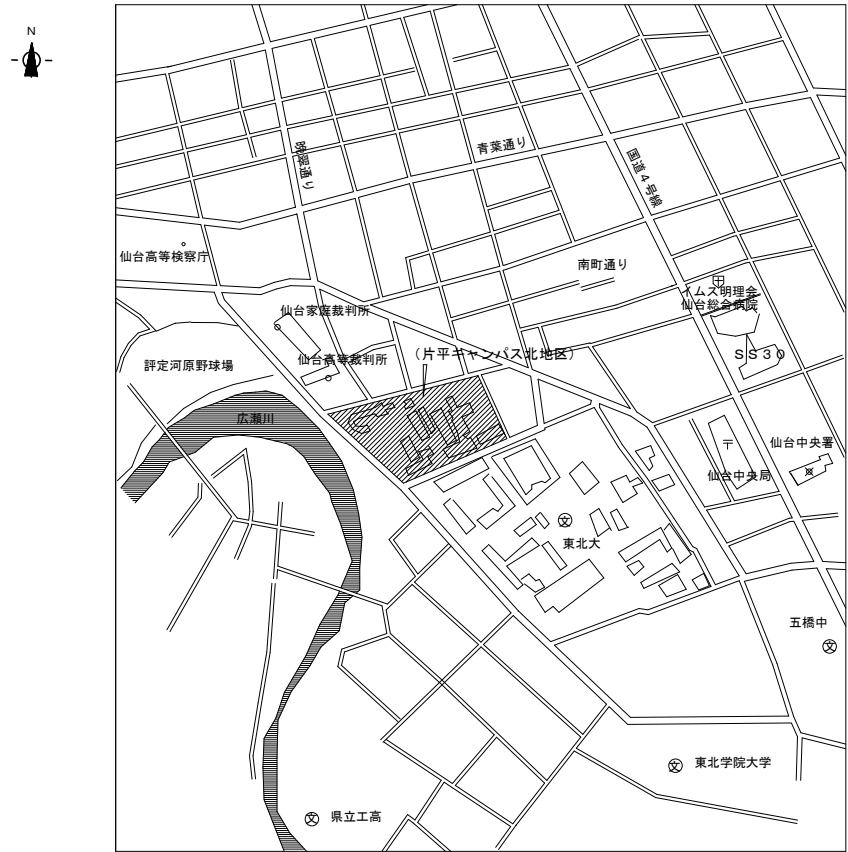

工事場所：宮城県仙台市青葉区片平二丁目１番５
（東北大学片平団地内）

付近見取図

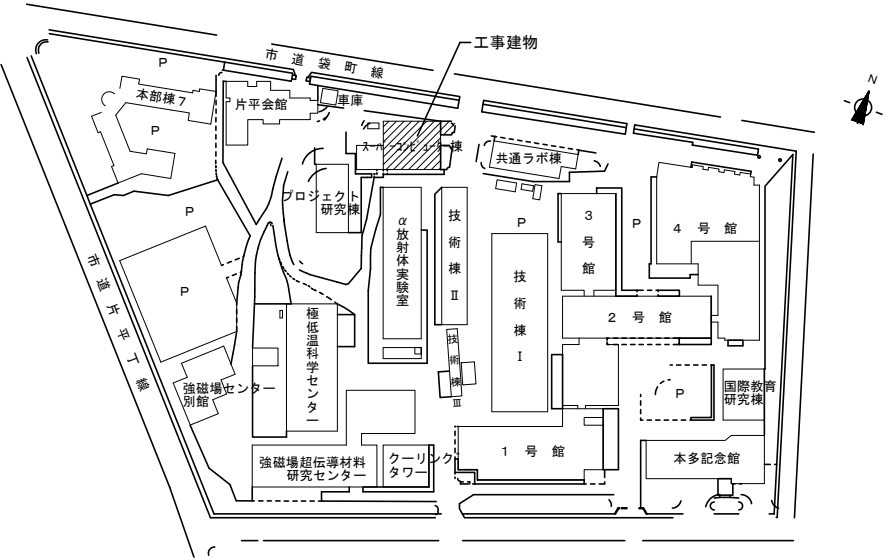


片平北キャンパス 配置図 NO SCALE

仕上表


室名		床	幅木	壁	天井	天井廻縁	天井高	その他
101号室 スーパー コンピューター室	既存	フリーアクセスフロア（パネル撤去） ※支持脚等は残置し再利用する	ビニル幅木	コンクリート打放し仕上+EP LGS下地+GB-R(9.0+12.0)+EP	LGS下地+GB-D	塩ビ廻縁（目透し）	2,500	戸当たり撤去：2か所
	改修	新規フリーアクセスフロア 帯電防止タイル仕上	既存のまま	EP-G塗替え（全つや）	既存のまま	既存のまま	既存のまま	既存鋼製建具（4か所）・既存AW1本額縁（1か所）： SOP塗替え（室内面のみ）、新規戸当たり取付：2か所

【凡 例】	
LGS	軽量鉄骨壁、天井下地
GB-R	石こうボード
GB-D	化粧石こうボード
SOP	合成樹脂膜合ベント
EP	合成樹脂エマルションペイント
EP-G	つや有り合成樹脂エマルションペイント

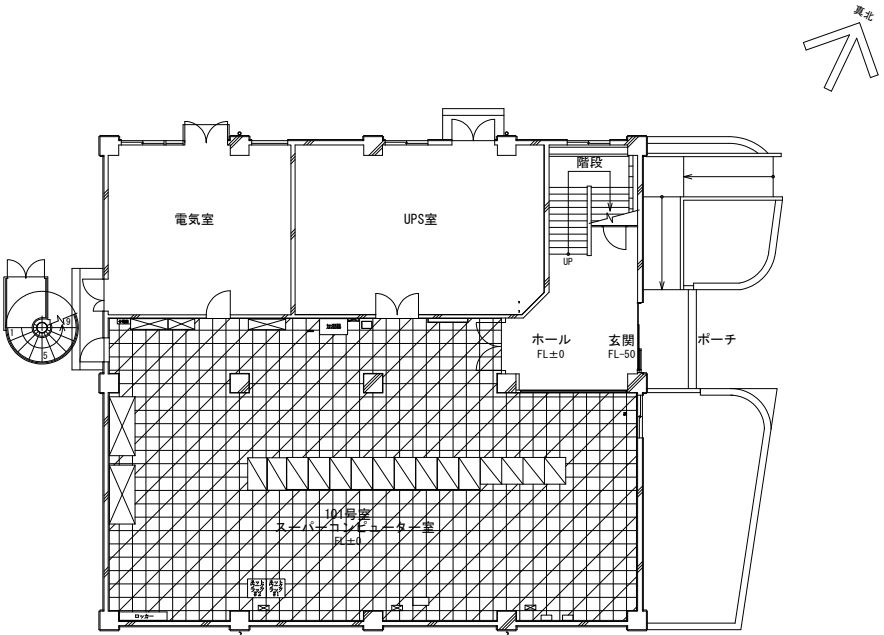

スーパーコンピューター棟 1 階平面図（既存） S:1/200(A3)

凡 例	
	撤去範囲

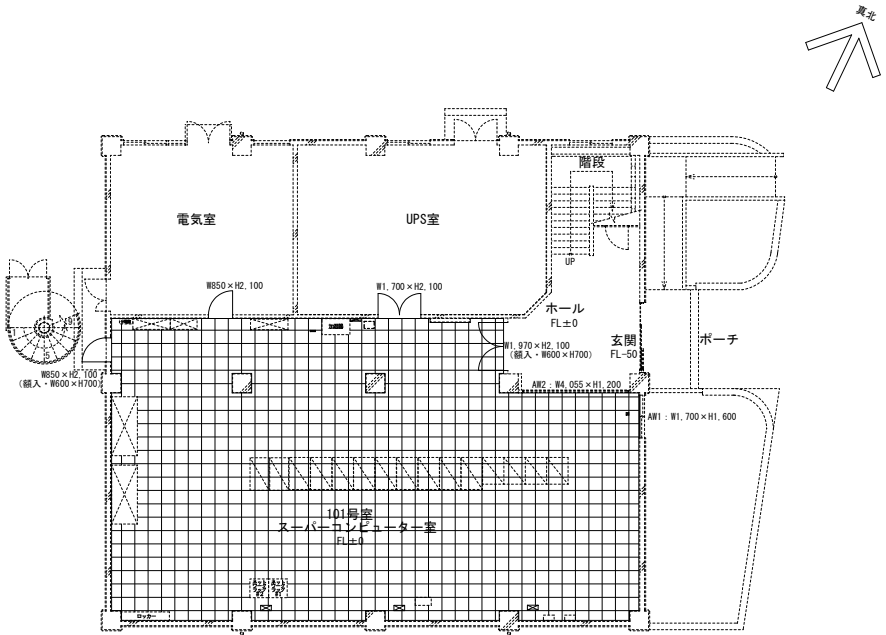

スーパーコンピューター棟 1 階平面図（改修） S:1/200(A3)

凡 例	
	パネル切り欠き
	床固定の什器等

- 【特記事項】
- ・シールドパネルは101号室の床面積分を見込むこと
 - ・予備品として下記のパネルを101号室内に納入すること
 - バンチングパネル：50枚
 - グレーチングパネル：15枚
