東北大学（片平）多元研工場棟便所等改修工事

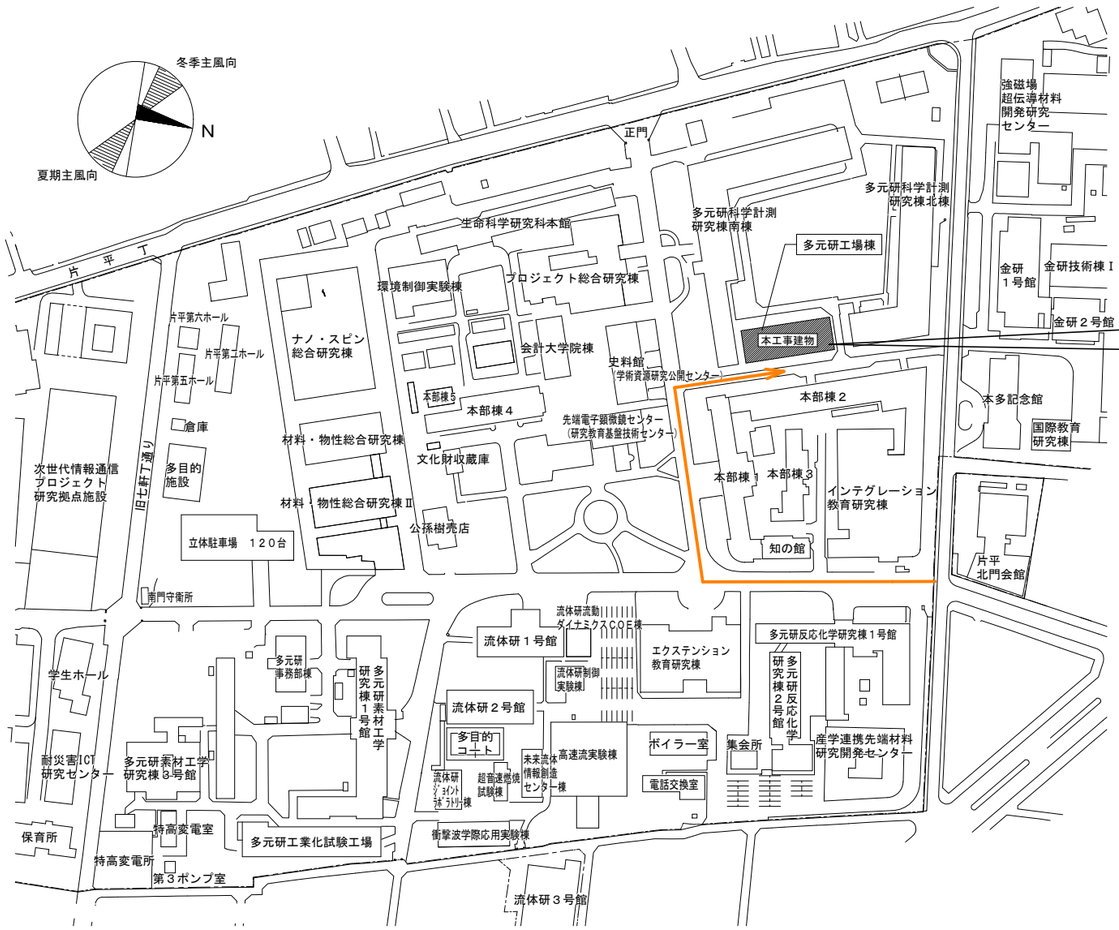

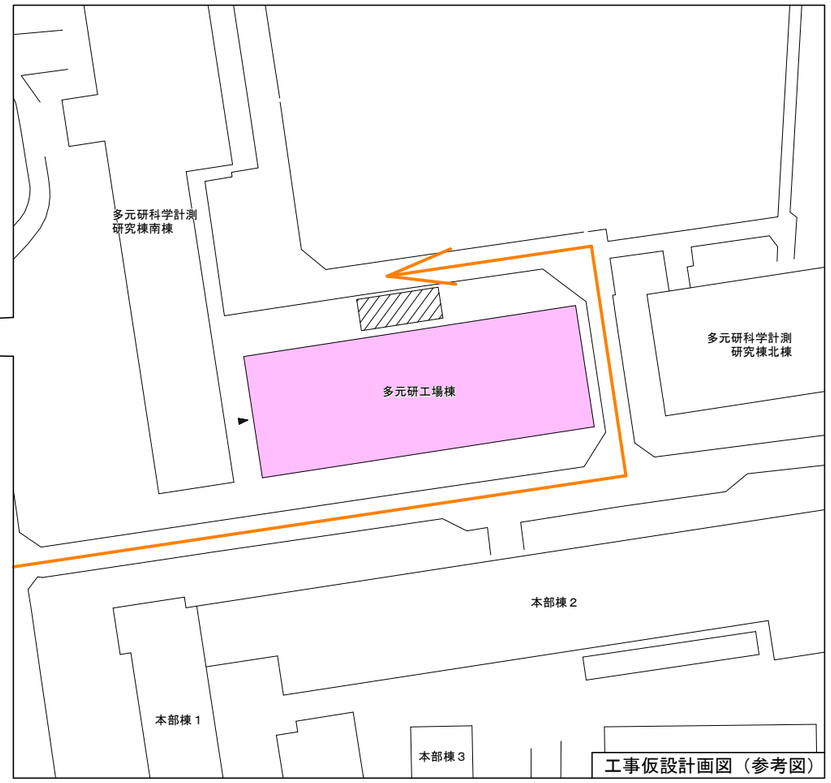

工事仮設計画図（参考図）

凡例
- ：本工事建物
- ：工事関係車両
  ※資材搬入・搬出時のみ

【凡例】
- ：本工事建物
- ：工事用地
  ※駐車場は構内の指定する場所を使用（５台分）。
- ：工事関係車両
  ※資材搬入・搬出時のみ
- ◄ ：建物出入口

【工事場所】宮城県仙台市青葉区片平２－１－１
【工　　期】平成30年2月～平成30年5月
【建物概要】◆改修建物

■多元研工場棟
- ・構造　鉄筋コンクリート造
- ・階数　平屋建
- ・建築面積　728.00㎡
- ・延べ面積　720.00㎡　（改修面積　約46㎡）

□外部仕上（既存のまま）
- ・屋　根：ＰＣ板（ダブルＴ版）の上、ｳﾚﾀﾝ系複合塗膜防水
- ・サッシ：アルミサッシ＋単板ガラス
- ・外　壁：コンクリートの上、複層塗材

□内部仕上（改修前）
- ・天　井：石綿板（塗装）、化粧せっこうボード
- ・　壁　：ラスモルタル塗り（塗装）、石綿板（塗装）
- ・　床　：合成樹脂塗床、ビニル床シート

（改修後）
- ・天　井：化粧せっこうボード
- ・　壁　：せっこうボード（塗装）
- ・　床　：ビニル床シート

□主要諸室　工場/加工室

□電気設備（別途工事）　電灯設備（照明・コンセント）/自動火災報知設備/情報通信網設備

□機械設備（別途工事）　空気調和設備/換気設備/衛生器具設備/給水設備/排水設備/給湯設備/ガス設備

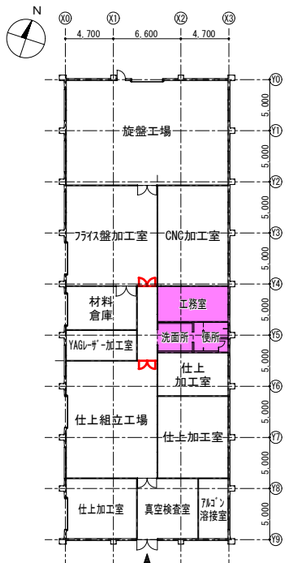

- ：工事範囲
- ：仮設間仕切
- ◄ ：建物出入口

平面図　S=1/600(A3)

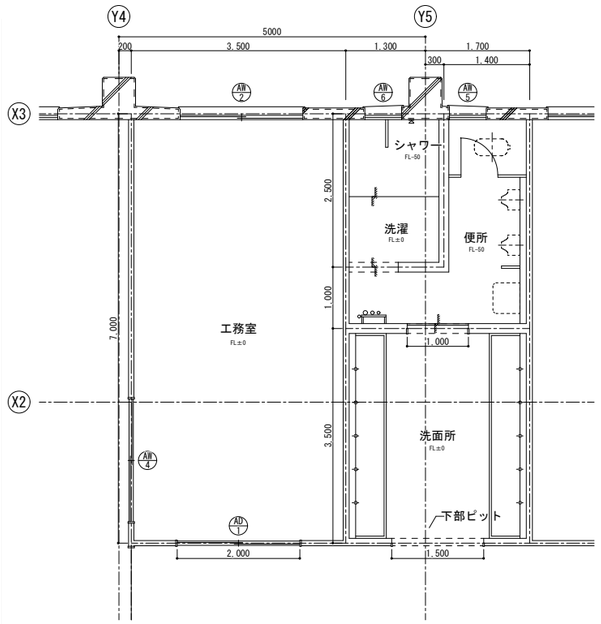

改修前　平面詳細図　S=1/100(A3)

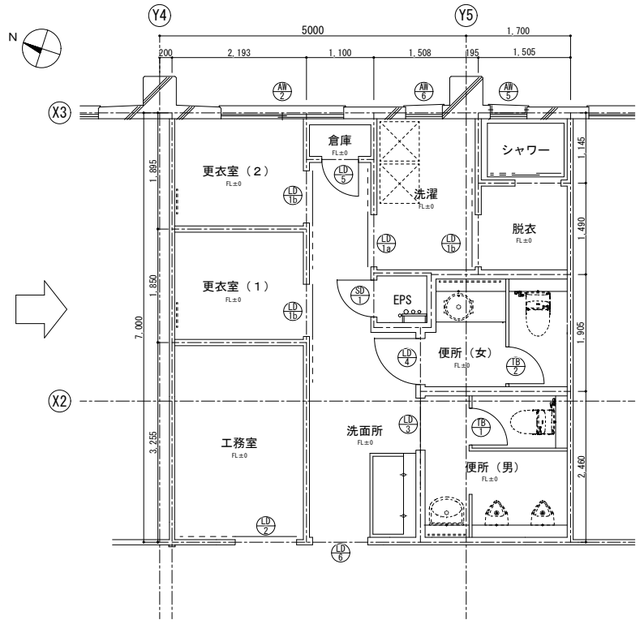

改修後　平面詳細図　S=1/100(A3)
